



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

MESSA IN SICUREZZA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO - FRAZIONE PECORINI A MARE - FILICUDI (ME)

Patto per il SUD-ME_17821 Lipari - Filicudi - Codice Caronte SI_1_17821 - CUP J69D16002060001

PROGETTO ESECUTIVO

Coordinamento e integrazione
delle prestazioni specialistiche

Ing. D. Majolino (IENCON-NETEC)

Geologia

Dott. F. Cannavò, Dott. M. Orifici (ORION)

Progettazione Geotecnica

PhD Ing. I.Cavarretta (IENCON-CDG)

Progettazione Idraulica e Stradale

PhD Ing. I.Cavarretta, Ing. S. Merlino (IENCON-CDG-NETEC)

Progettazione Strutturale

PhD Ing. I.Cavarretta (IENCON-CDG)

Progettazione Paesaggistica

Arch. B. Versaci (ORION)

Progettazione Ambientale

Ing. S. Merlino (IENCON-NETEC)

Coordinamento sicurezza in progettazione

Ing. M. Brancatelli (ORION)

Cantierizzazione e interferenze

Ing. M. Brancatelli (ORION)

Elaborati Economici

Ing. G. Baratta (IENCON-NETEC)

Sistema Gestione Qualità

Ing. L. Gangitano (IENCON-CDG)

Visto:

il R.U.P.

Arch. Mirko Ficarra

Raggruppamento temporaneo:



CIVIL DESIGN GROUP
C.D.G. INGEGNERIA



DATA:

--/--/--

CONSORTILE MANDATARIA - s.c.a.r.l.

CONSORZIE ESECUTRICI - s.r.l.

SOCIETÀ MANDANTE - s.r.l.s.

Sicurezza Cronoprogramma

codice progetto						nome file						REVISIONE		SCALA							
progetto						liv. prog.		n. prog.		T00_S100_SIC_CR01_C											
F I L I 2 4						E		0 0 0 1		opera/ progr.		ambito/progr.		cod. disciplina		cod. tipo elab.					
T 0 0						S I 0 0		S I C		C R 0 1		C									
C		Terza emissione										Settembre 2024		Ing. M. Brancatelli		Ing. D. Majolino		Ing. L. Gangitano			
B		Seconda emissione										Luglio 2024		Ing. M. Brancatelli		Ing. D. Majolino		Ing. L. Gangitano			
A		Prima emissione										Marzo 2024		Ing. M. Brancatelli		Ing. D. Majolino		Ing. L. Gangitano			
REV.		MOTIVO DELLA REVISIONE										DATA		REDATTO		VERIFICATO		APPROVATO			

Cod.	Attività	Importo lavori a misura (importo lavori a base d'asta più manodopera)	Inizio	Fine	Durata gg
1	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO				
A	VERIFICA E VALIDAZIONE		01/06/2024	16/06/2024	15
B	FINANZIAMENTO INTERVENTO		25/06/2024	27/06/2024	2
2	PROCEDURE DI GARA DI APPALTO				
C	PUBBLICAZIONE BANDO		26/07/2024	25/08/2024	30
D	TIMING DI GARA (PRESENTAZIONE OFFERTE)		20/09/2024	09/11/2024	50
E	AGGIUDICAZIONE EFFICACE		15/11/2024	24/01/2025	70
F	STIPULA CONTRATTO		20/12/2024	19/01/2025	30
3	ESECUZIONE LAVORI				
G	CONSEGNA LAVORI		10/01/2025	11/01/2025	1
H	INCANTIERAMENTO		15/01/2025	30/01/2025	15
I	Interventi di stabilizzazione attiva dei versanti (funi, reti metalliche ,ancoraggi	€ 1.845.046,69	30/01/2025	28/08/2025	210
L	Interventi di stabilizzazione passiva dei versanti (muri controripa)	€ 217.172,41	28/08/2025	11/11/2025	75
M	Opere stradali accessorie (cunette, cordoli ecc)	€ 209.443,70	11/11/2025	11/03/2026	120
N	Costruzione opere d'arte tombini idraulici (scavi, rinterri, murature)	€ 341.616,44	10/01/2026	10/05/2026	120
O	Lavori stradali di scarifica (€ 203.663,43) e trasporti a discarica (€ 98.629,88)	€ 302.293,31	11/03/2026	10/05/2026	60
P	Pavimentazioni con conglomerati bituminosi (binder GG.30 + usura GG.30)	€ 1.052.111,54	10/05/2026	09/07/2026	60
Q	Segnaletica orizzontale, verticale e barriere di sicurezza	€ 71.764,16	09/06/2026	09/07/2026	30
4	ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO		15/01/2025	08/03/2027	
S	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE		08/12/2026	08/03/2027	90
NB. LE ATTIVITA DI COLLAUDO PROCEDONO IN PARALLELO ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI		€ 4.039.448,25			

TOTALE CICLO VITA INTERVENTO

1010

TOTALE LAVORI


540

naturali consecutivi

GG.

GG.

DURATA (gg)

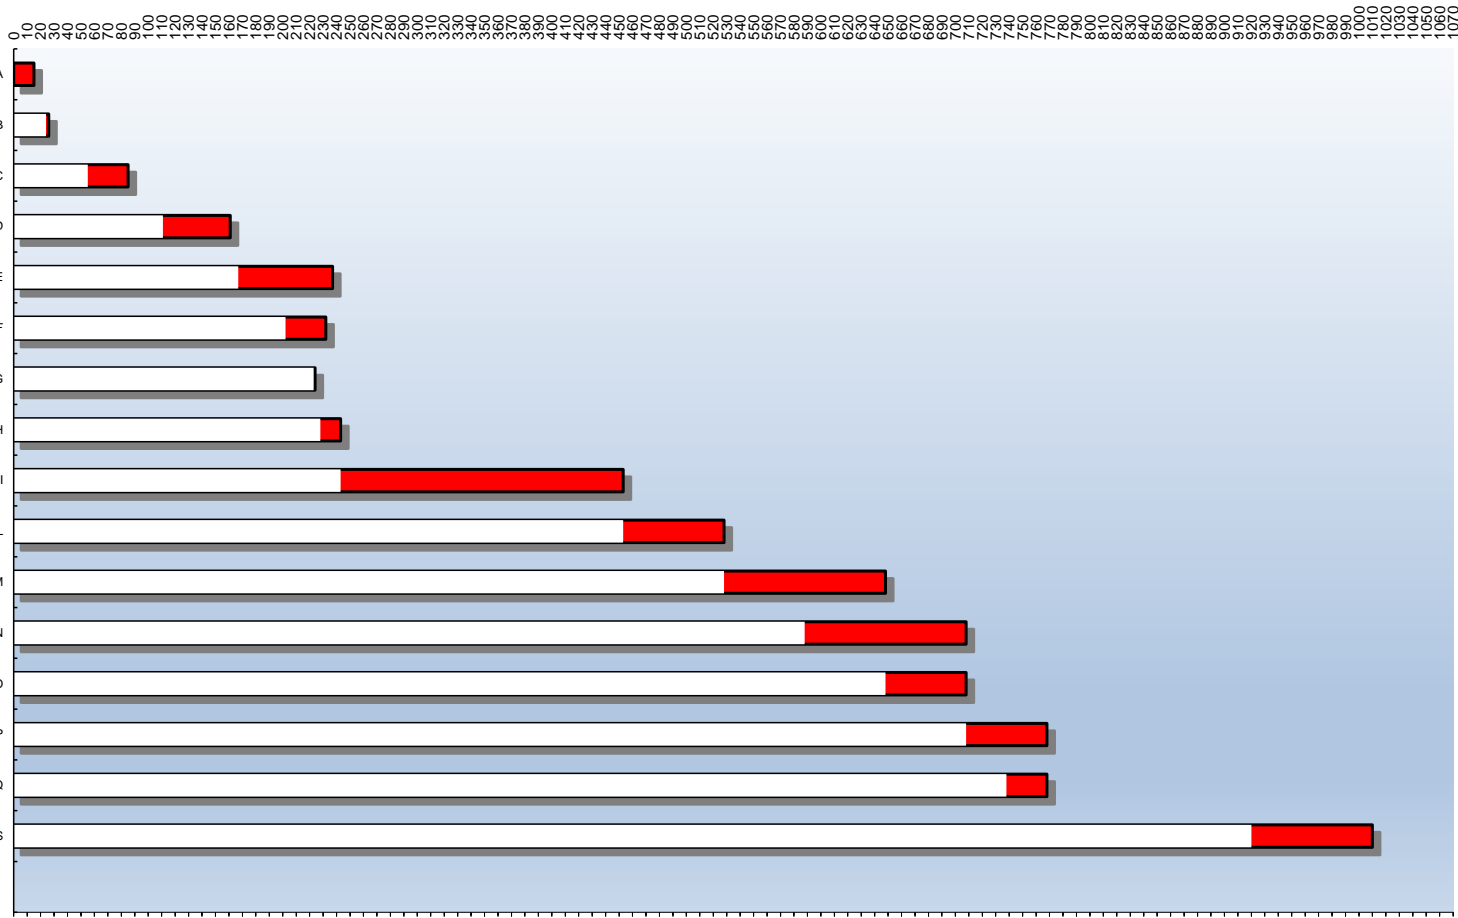

Andamento produzione

